

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI SŁAWA

ETAP I - ZLEWNIA OCZYSZCZALNI KRĄŻKOWO

WARTOŚĆ UMOWY
93 421 702,92 zł brutto



ZAMAWIAJĄCY:

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W SŁAWIE



GENERALNY WYKONAWCA:

KONSORCJUM FIRM: Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych „PIEC-BUD” Wrocław



Sp. z o.o. – Lider

PBSiM

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO i MELIORACJI Sp. z o.o. – Partner



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Dnia 24 sierpnia 2018 roku podpisana została umowa



Fotografia, Źródło: <http://zwik.slawa.pl/umowa-podpisana-roboty-ruszaja-2/>

Dnia 2 października 2018 roku został wbudowany kamień węgielny



Fotografia, Źródło: Archiwum Generalnego Wykonawcy

Etap I realizowany jest na terenie 8 miejscowości: Krązkowo, Lipinki, Radzyń, Kuźnica Głogowska, Głuchów, Tarnówek, Myszyniec, Tarnów Jezierny.

Etap I obejmować będzie budowę nowej Stacji Uzdatniania Wody w Kuźnicy Głogowskiej, modernizacje istniejących Stacji w Lubogoszczy oraz Krązkowie, budowę nowej Oczyszczalni Ścieków w Krązkowie oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wszystkich miejscowościach objętych Inwestycją.

Najważniejszym zadaniem inwestycji jest poprawa jakości oraz wygody życia mieszkańców gminy Sława.



UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
NA TERENIE AGLOMERACJI SŁAWA ETAP I
ZLEWNIA OCZYSZCZALNI KRĄŻKOWO



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Nr elementu scalonego	Zakres rzeczowy	Ilość w kpl.	Długość sieci w mb
ES1	Kanalizacja sanitarna dla wsi Głuchów oraz rurociąg tłoczny Głuchów – Tarnówek Etap II		864,50
ES2	Kanalizacja sanitarna dla wsi Tarnówek oraz rurociąg tłoczny Tarnówek – Kuźnica Głogowska		2615,00
ES3	Kanalizacja sanitarna dla wsi Kuźnica Głogowska oraz rurociąg tłoczny Kuźnica Głogowska - Radzyń		4508,50
ES4	Kanalizacja sanitarna dla wsi Myszyniec oraz rurociąg tłoczny Myszyniec – Kuźnica Głogowska		4779,00
ES5	Kanalizacja sanitarna dla wsi Tarnów Jezierny oraz rurociąg tłoczny Tarnów Jezierny - Głuchów		10 825,50
ES6	Kanalizacja sanitarna dla wsi Radzyń oraz rurociąg tłoczny Radzyń - Lipinki		20 429,00
ES7	Kanalizacja sanitarna dla wsi Lipinki oraz rurociąg tłoczny Lipinki - Krążkowo		8 977,31

Nr elementu scalonego	Zakres rzeczowy	Ilość w kpl.	Długość sieci w mb
ES8	Kanalizacja sanitarna dla wsi Krążkowo		6 585,17
ES9	Oczyszczalnia Krążkowo Etap I	1	
	Budowa sieci wodociągowej i zasilanie elektroenergetyczne do oczyszczalni Krążkowo	1	
Łącznie			59583,98m=59,58 km

Nr elementu scalonego	Zakres rzeczowy	Ilość w kpl.	Długość sieci w mb
ES10	Sieć wodociągowa dla wsi/przysiółka Głuchów z siecią wodociągową tranzytową Głuchów Tarnówek Etap II		644,00
ES11	Sieć wodociągowa dla wsi/przysiółka Tarnówek z siecią wodociągową tranzytową – Tarnówek Kuźnica Głogowska		2 754,00
ES12	Sieć wodociągowa dla wsi/przysiółka Myszyniec z siecią wodociągową Myszyniec – Kuźnica Głogowska		4 459,00
ES13	Sieć wodociągowa dla wsi Tarnów Jezierny		9 454,60
ES14	Sieć wodociągowa dla wsi Radzyń z rurociągiem tranzytowym Radzyń – Kuźnica Głogowska		17 336,00

Nr elementu scalonego	Zakres rzeczowy	Ilość w kpl.	Długość sieci w mb
ES15_1	Budowa sieci wodociągowej w m. Kuźnica Głogowska		2 126,50
ES15_2	Ujęcie i stacja uzdatniania wody w miejscowości Kuźnica Głogowska	1	
ES 16	Modernizacja SUW w m. Krążkowo	1	
	Modernizacja SUW w m. Lubogoszcz	1	
Łącznie			36774,1m=36,77km



UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
NA TERENIE AGLOMERACJI SŁAWA ETAP I
ZLEWNIA OCZYSZCZALNI KRĄŻKOWO




Unia Europejska
Fundusz Spójności



WARTOŚĆ ZADANIA W STOSUNKU DO WARTOŚCI CAŁEJ INWESTYCJI

■ Wartość zadania ■ Wartość wykonanych robót

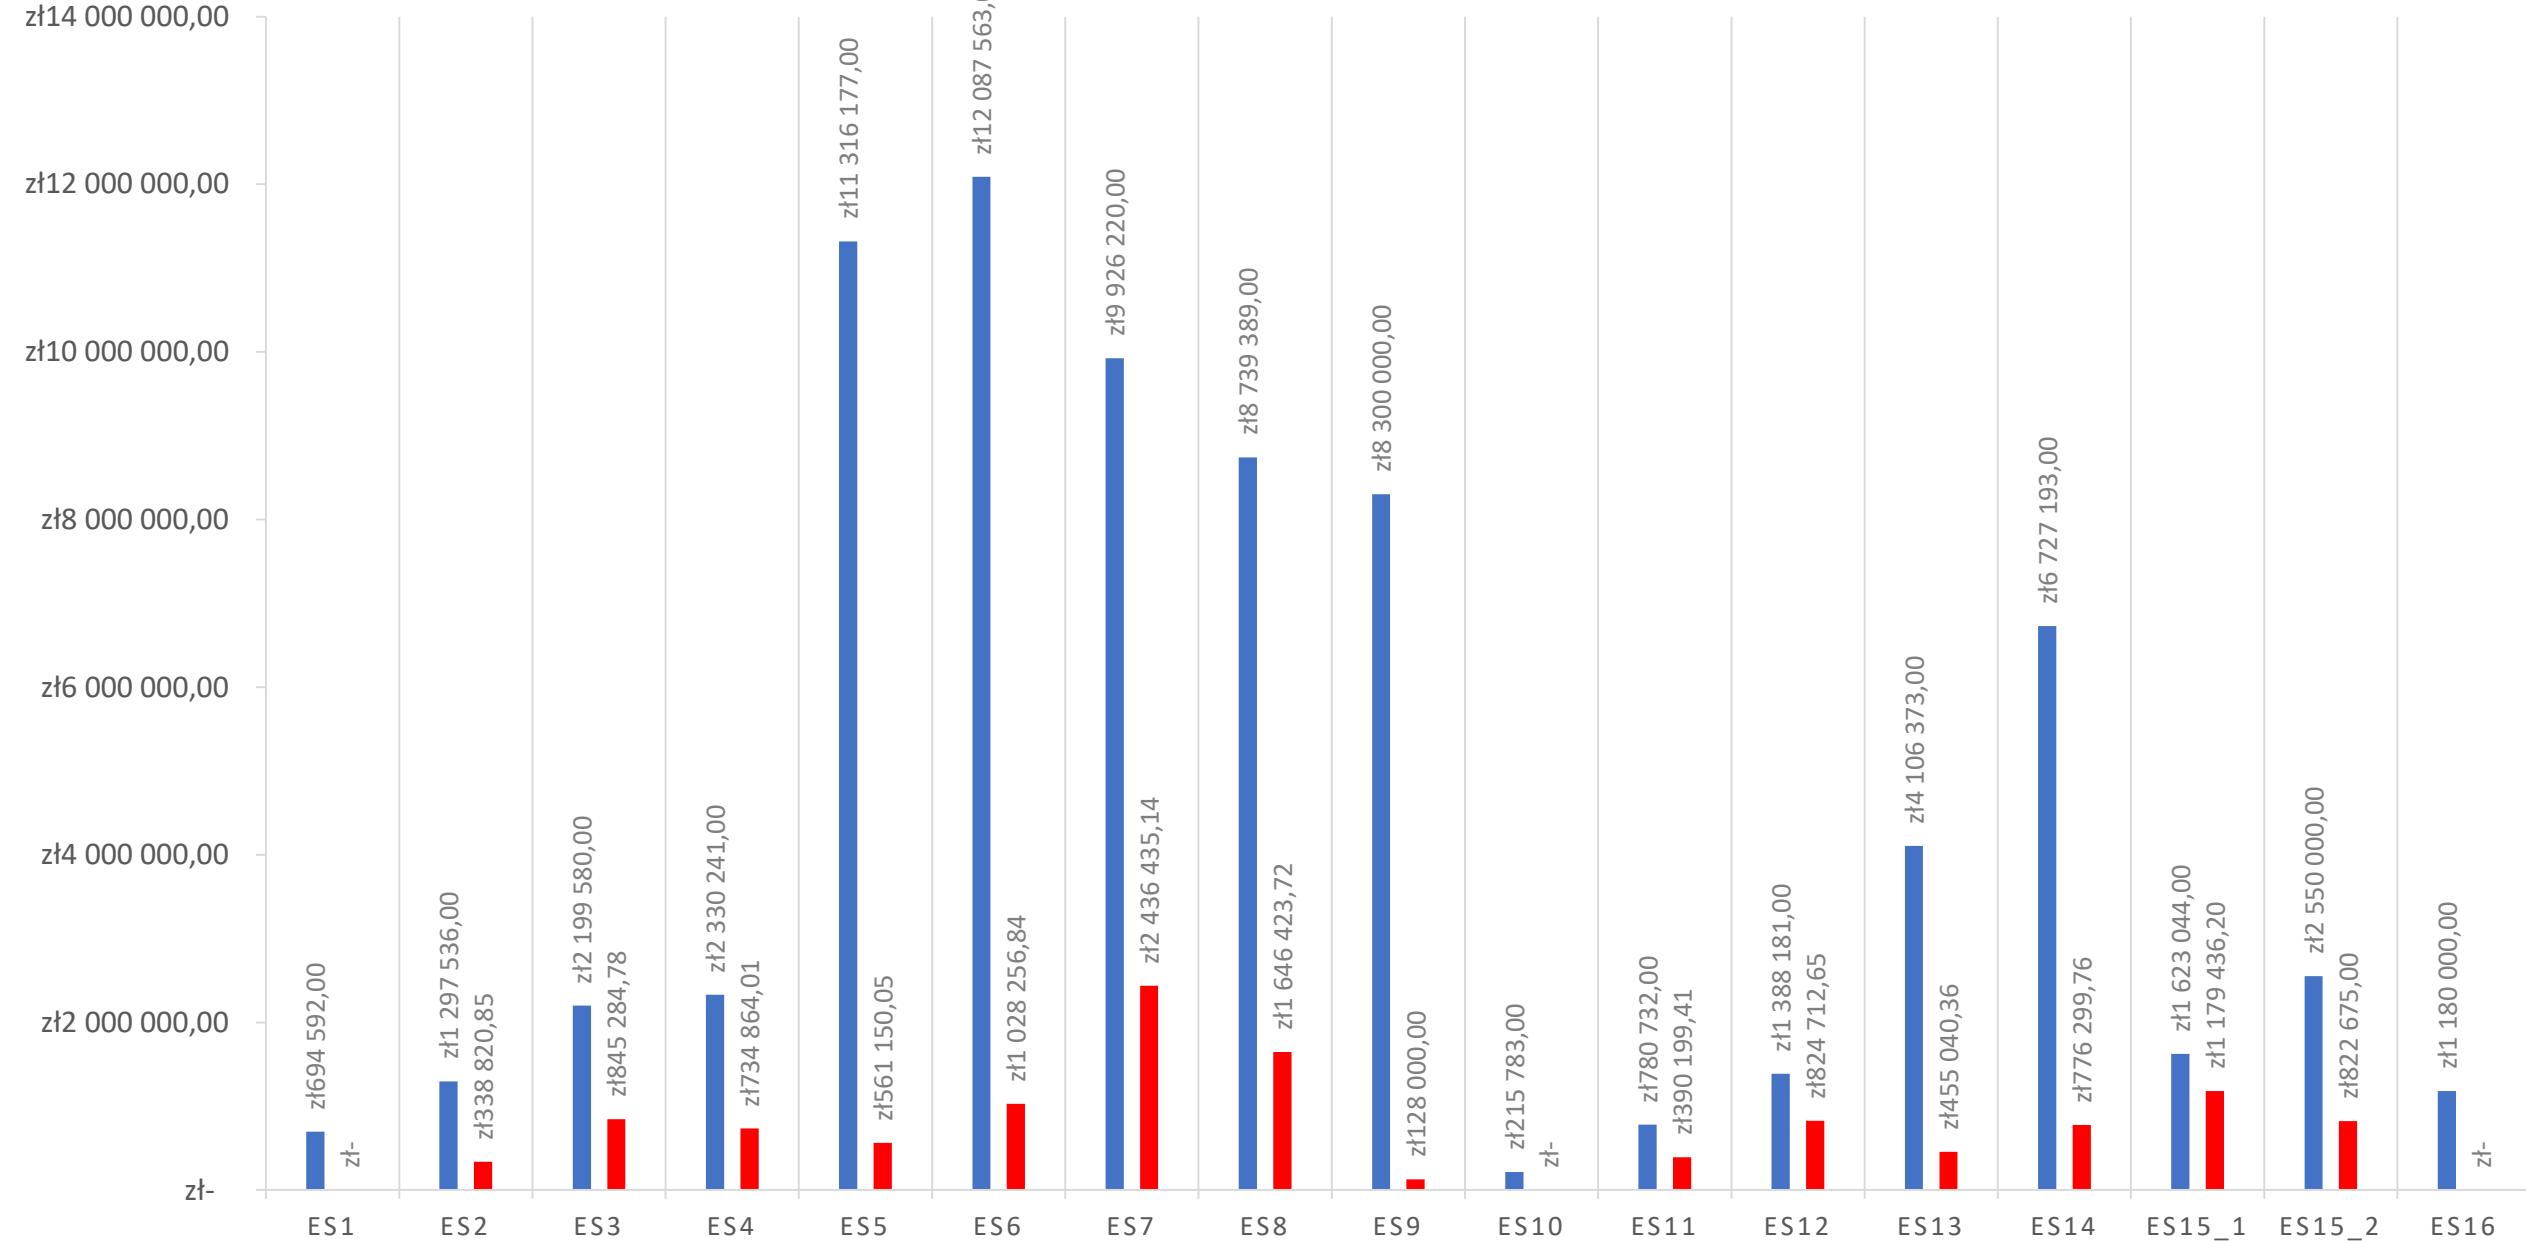

Plan realizacji

Miejscowość	Nr elementu scalonego	2018	2019				2020				2021		
		IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał
Głuchów	ES1												
	ES10												
Tarnówek	ES2												
	ES11												
Kuźnica Głogowska	ES3												
	ES15_1												
Myszyniec	ES4												
	ES12												
Tarnów Jezierny	ES5												
	ES13												
Radzyń	ES6												
	ES14												
Lipinki	ES7												
Krążkowo	ES8												
SUW Kuźnica Głogowska	ES15_2												
SUW Lubogoszcz	ES16												
SUW Krążkowo	ES16												
OŚ Krążkowo	ES9												





UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
NA TERENIE AGLOMERACJI SŁAWA ETAP I
ZLEWNIA OCZYSZCZALNI KRĄŻKOWO



Unia Europejska
Fundusz Spójności




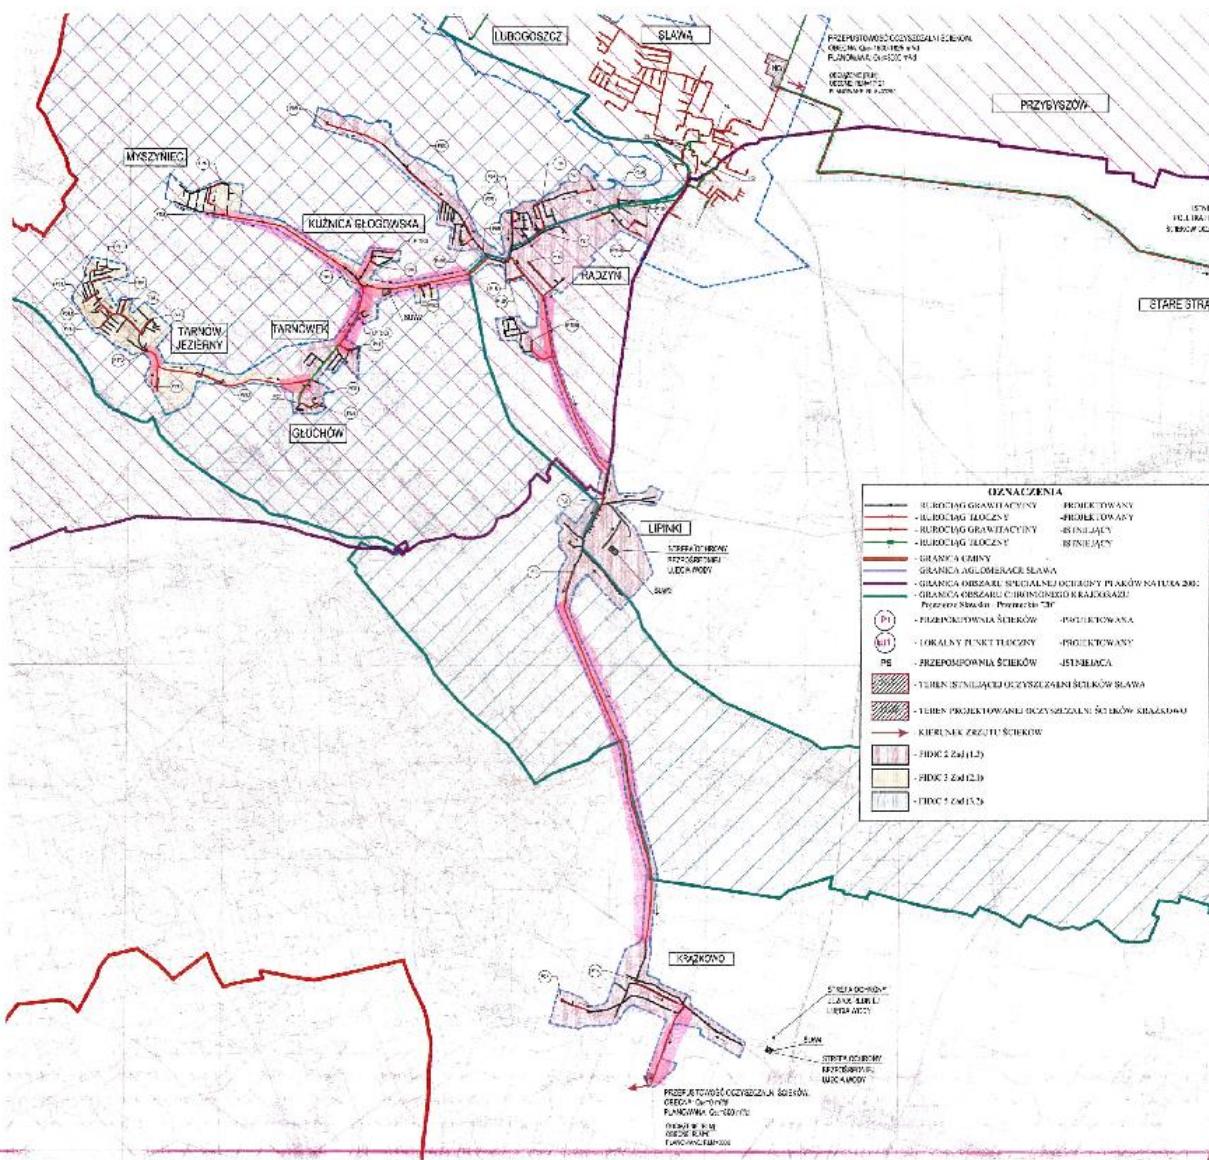


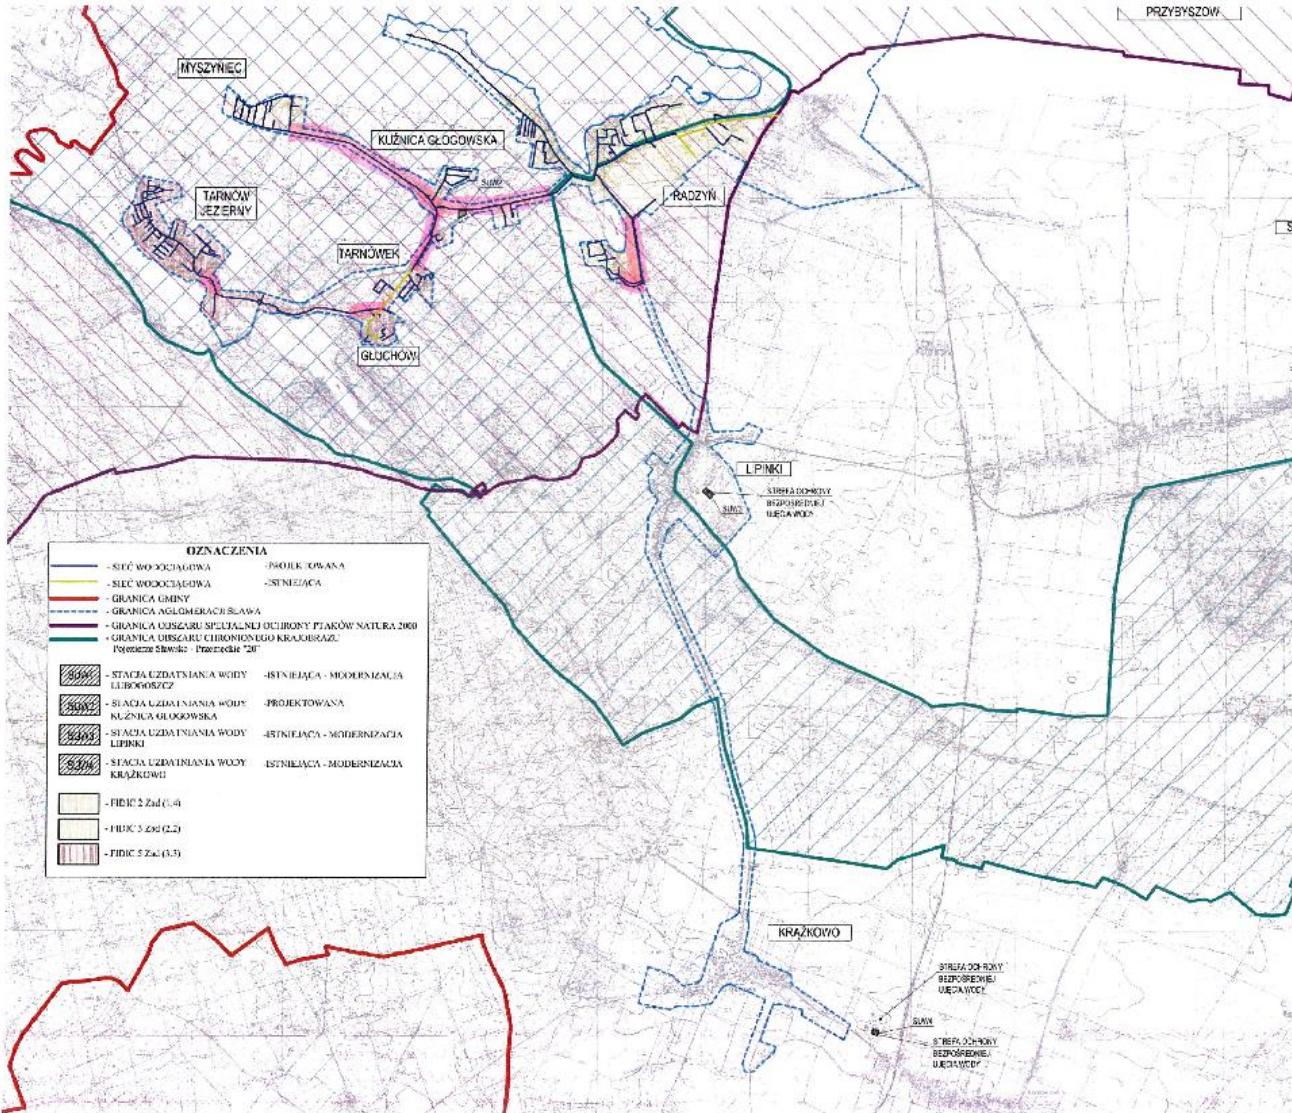

Miejscowość Głuchów

ES 1: Kanalizacja sanitarna dla wsi Głuchów oraz rurociąg tłoczny Głuchów – Tarnówek Etap II



ES10: Sieć wodociągowa dla wsi/przysiółka Głuchów z siecią wodociągową tranzytową Głuchów Tarnówek Etap II

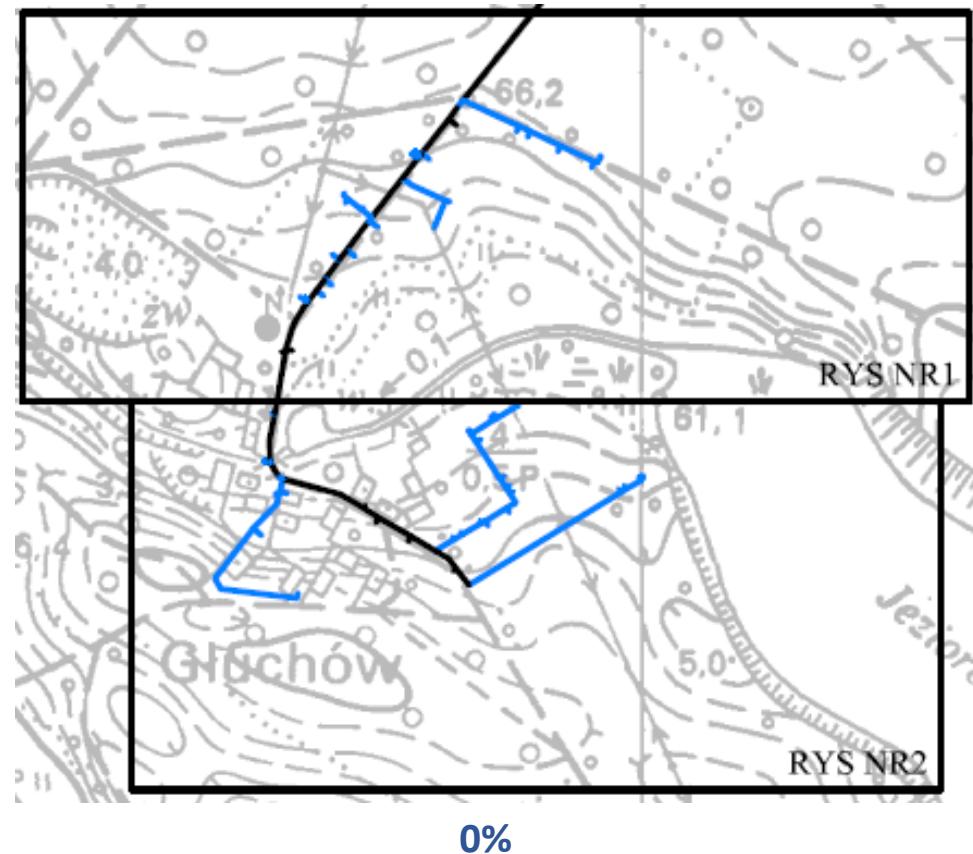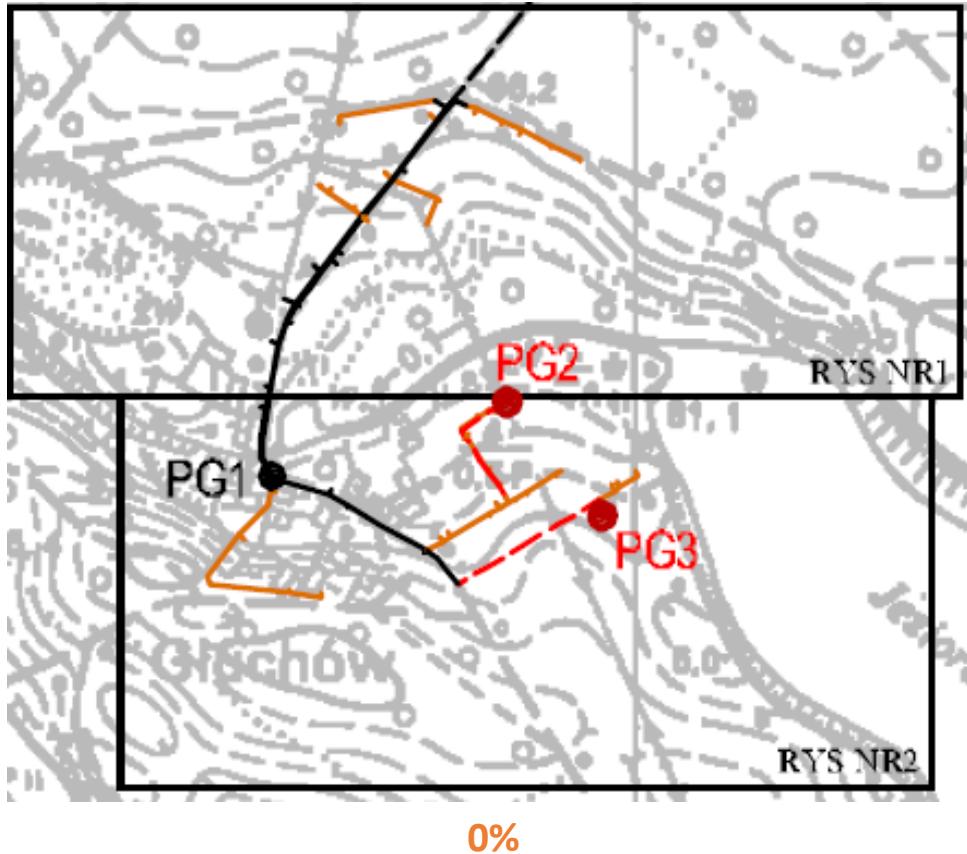

Miejscowość Tarnówek


ES 2: Kanalizacja sanitarna dla wsi Tarnówek oraz rurociąg tłoczny Tarnówek – Kuźnica Głogowska

ES11: Sieć wodociągowa dla wsi/przysiółka Tarnówek z siecią wodociągową tranzytową – Tarnówek Kuźnica Głogowska

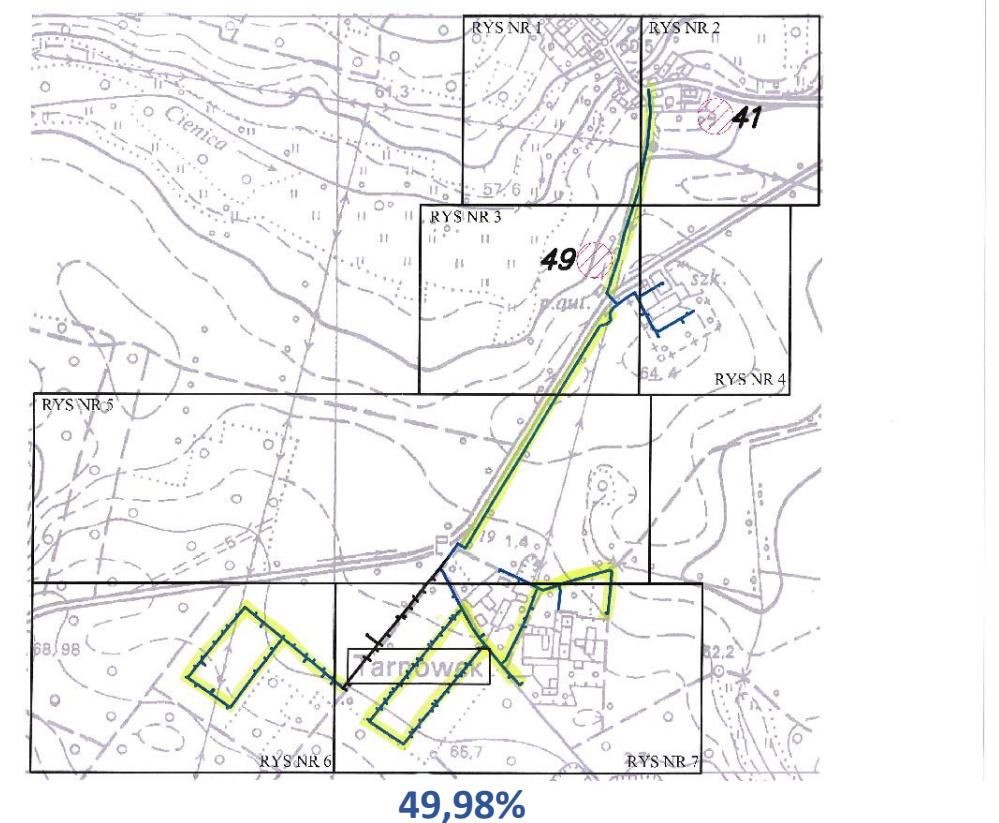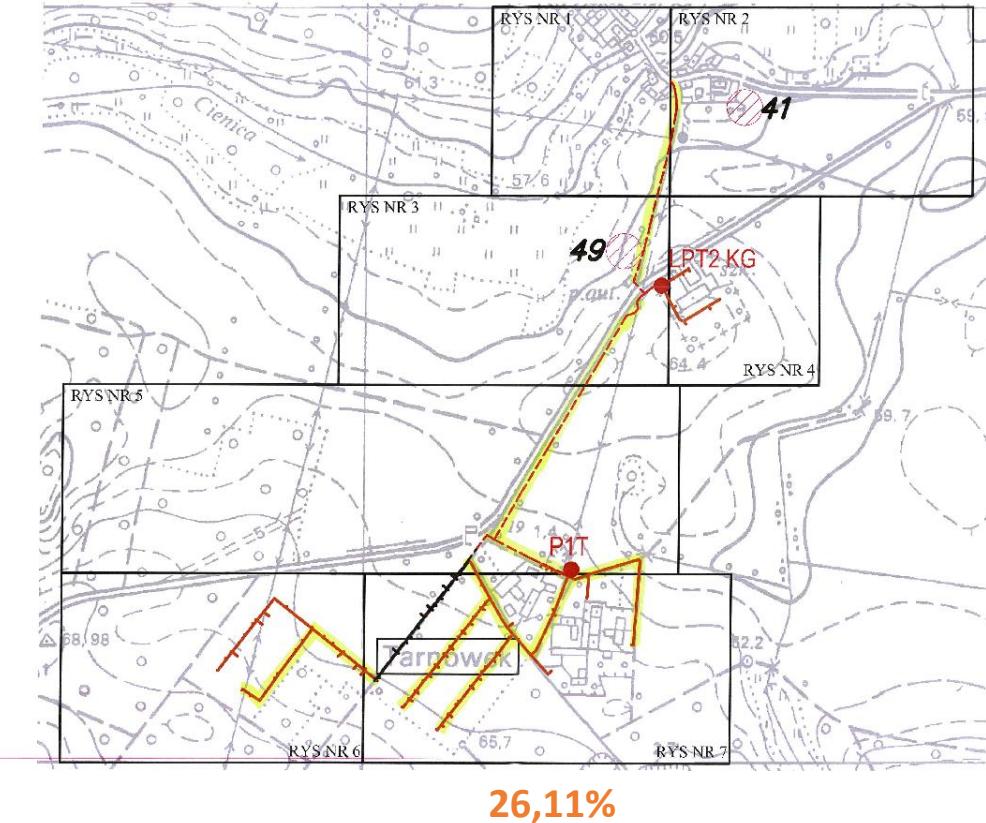


Miejscowość Kuźnica Głogowska

ES3: Kanalizacja sanitarna dla wsi Kuźnica Głogowska oraz rurociąg tłoczny Kuźnica Głogowska - Radzyń

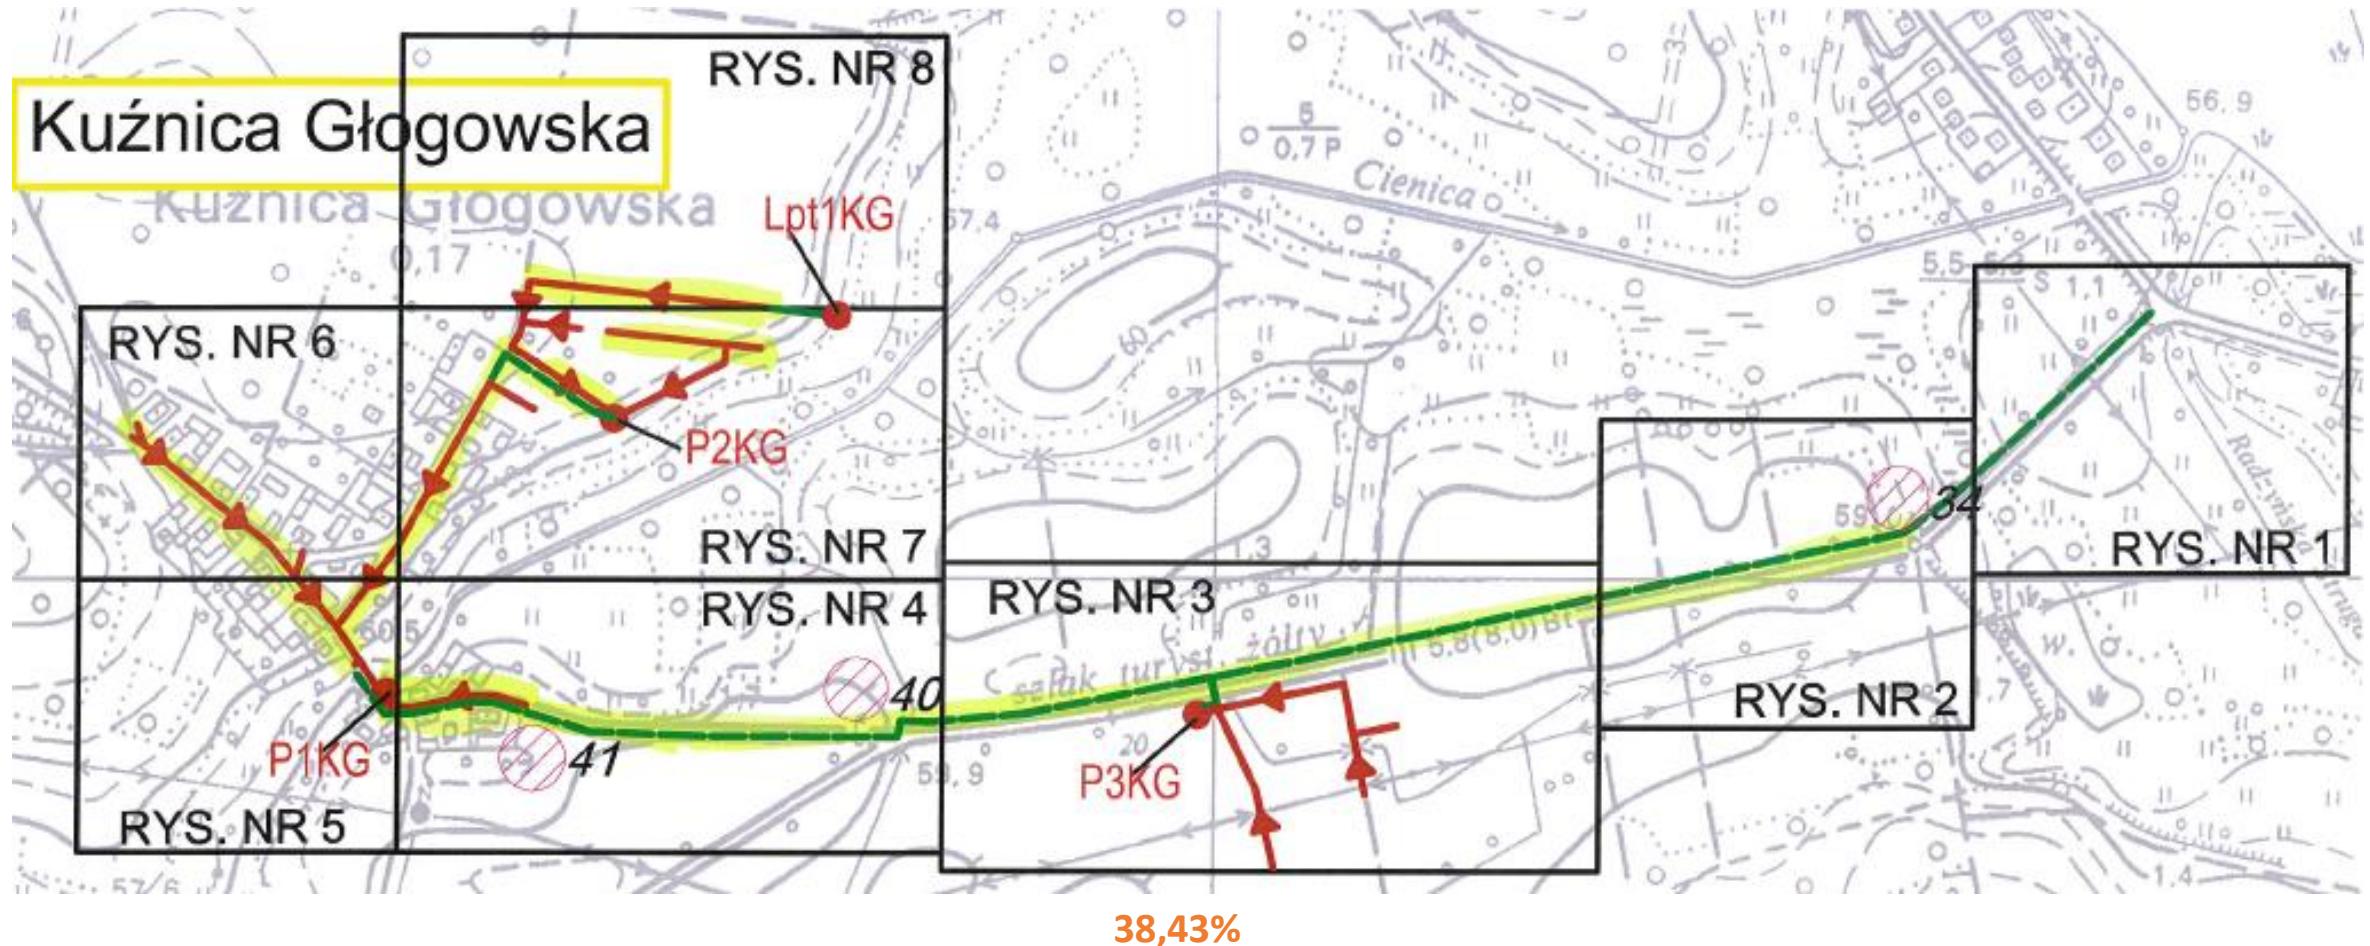

Miejscowość Kuźnica Głogowska


ES15_1: Budowa sieci wodociągowej w m. Kuźnica Głogowska

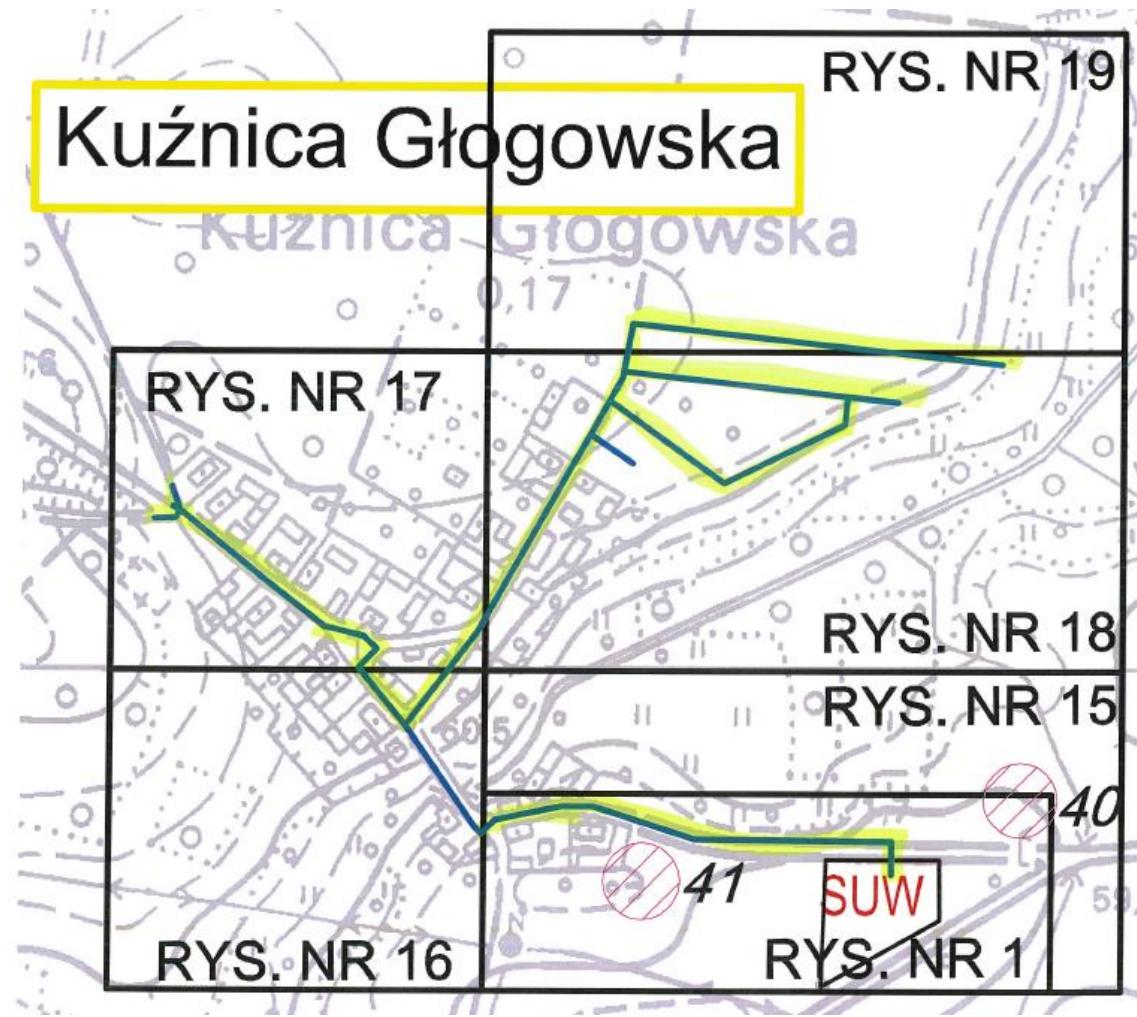

72,67%


Miejscowość Myszyniec

ES 4: Kanalizacja sanitarna dla wsi Myszyniec oraz rurociąg tłoczny Myszyniec – Kuźnica Głogowska

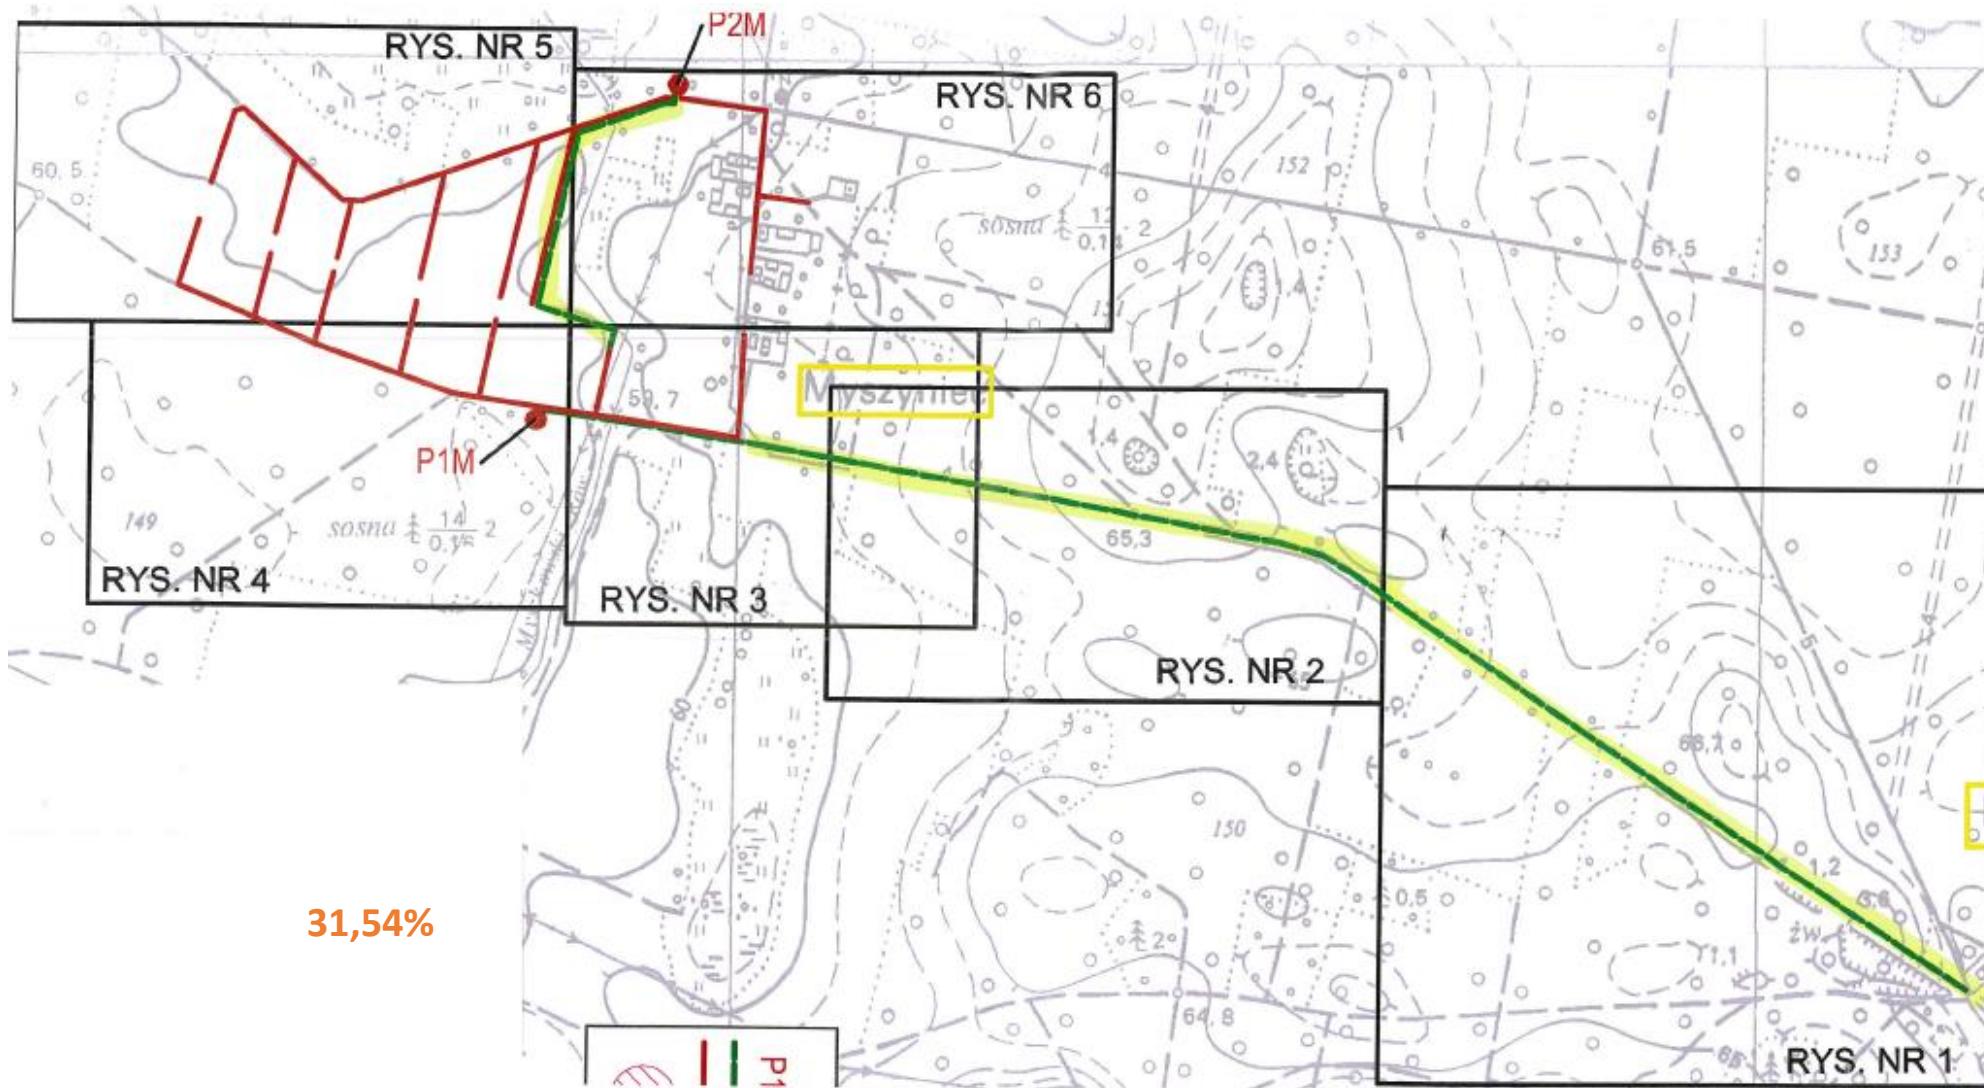


Miejscowość Myszyniec

ES12: Sieć wodociągowa dla wsi/przysiółka Myszyniec z siecią wodociągową Myszyniec – Kuźnica Głogowska

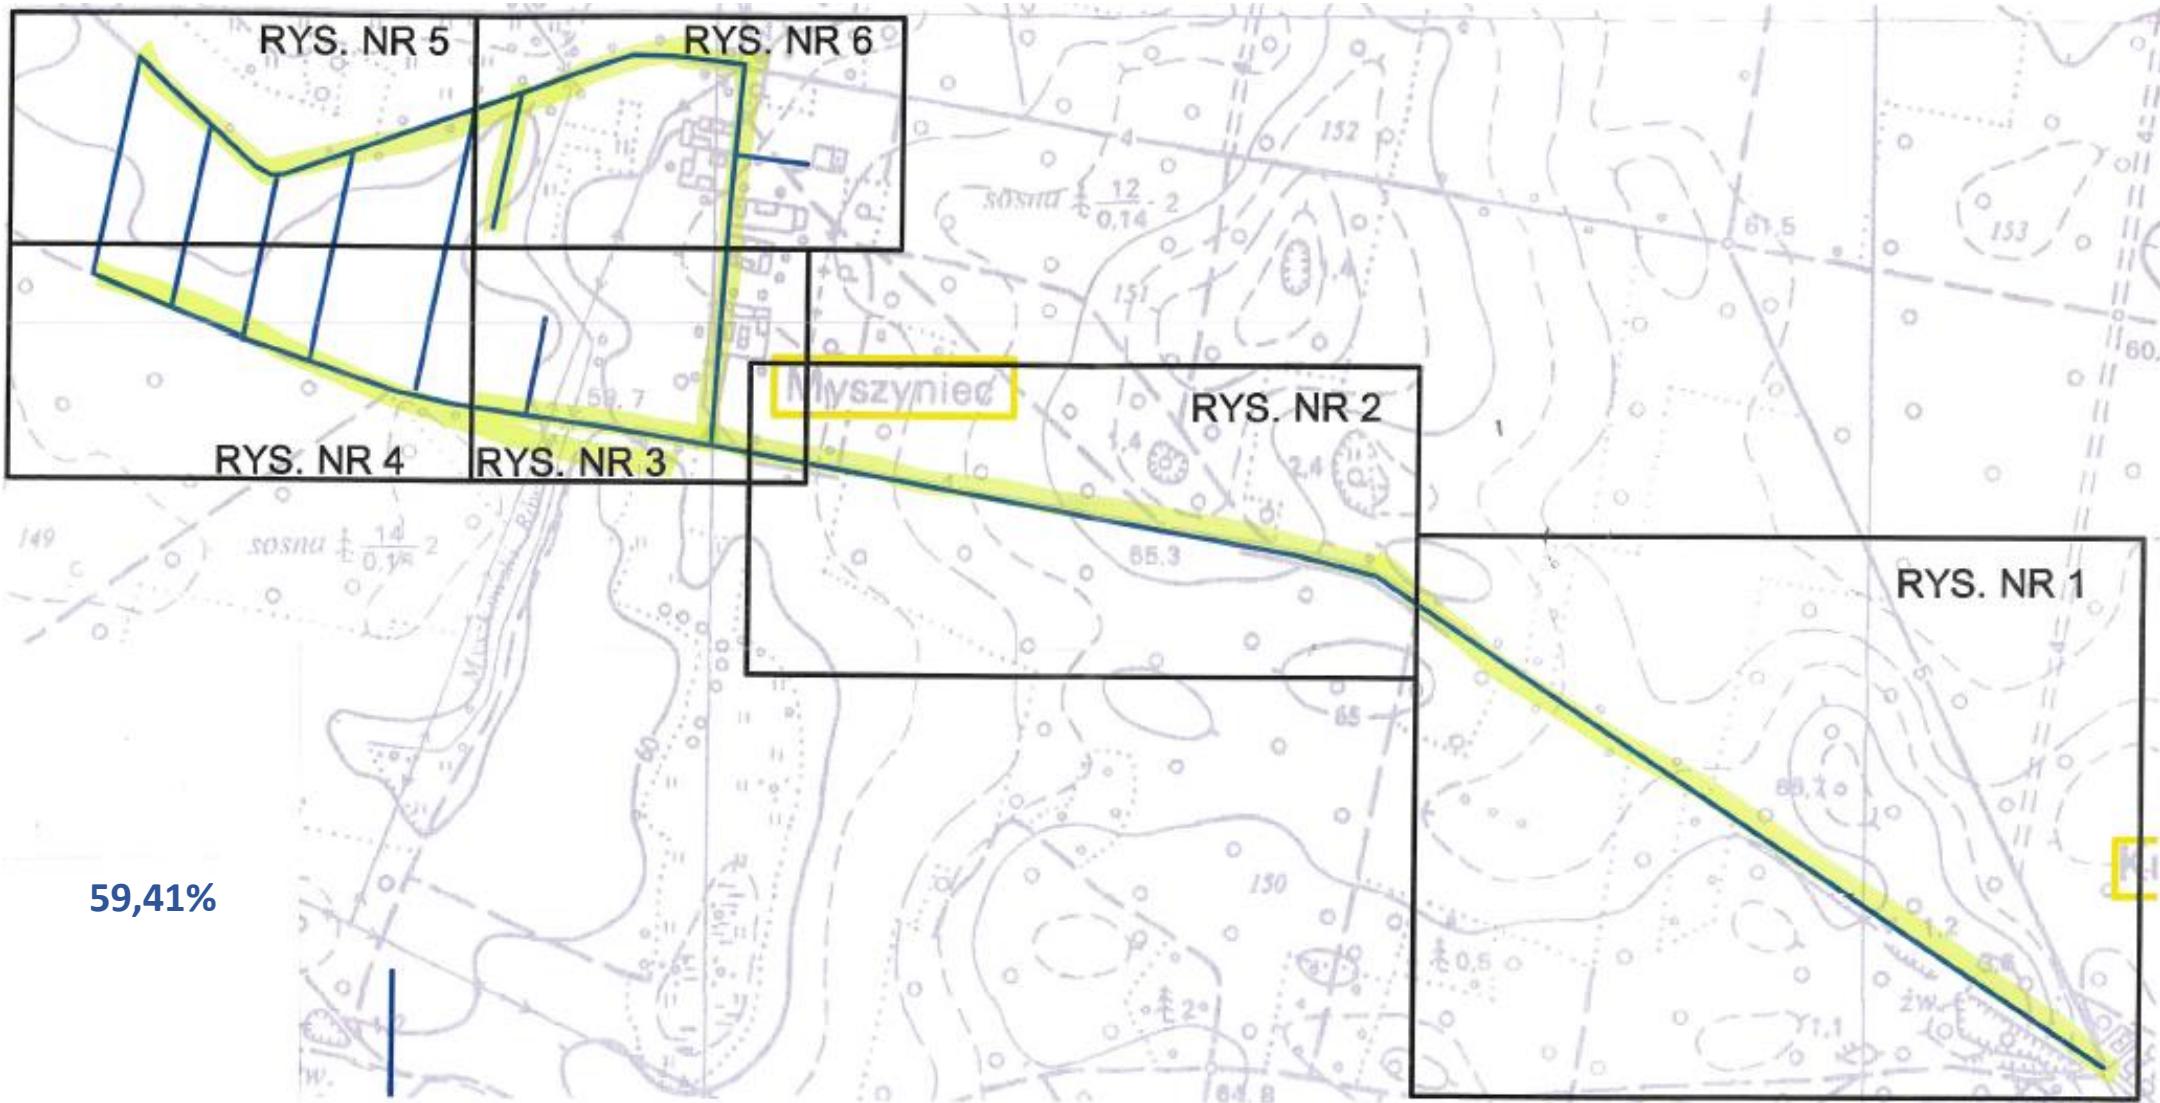


Miejscowość Tarnów Jezierny

ES 5: Kanalizacja sanitarna dla wsi Tarnów Jezierny oraz rurociąg tłoczny Tarnów Jezierny - Głuchów

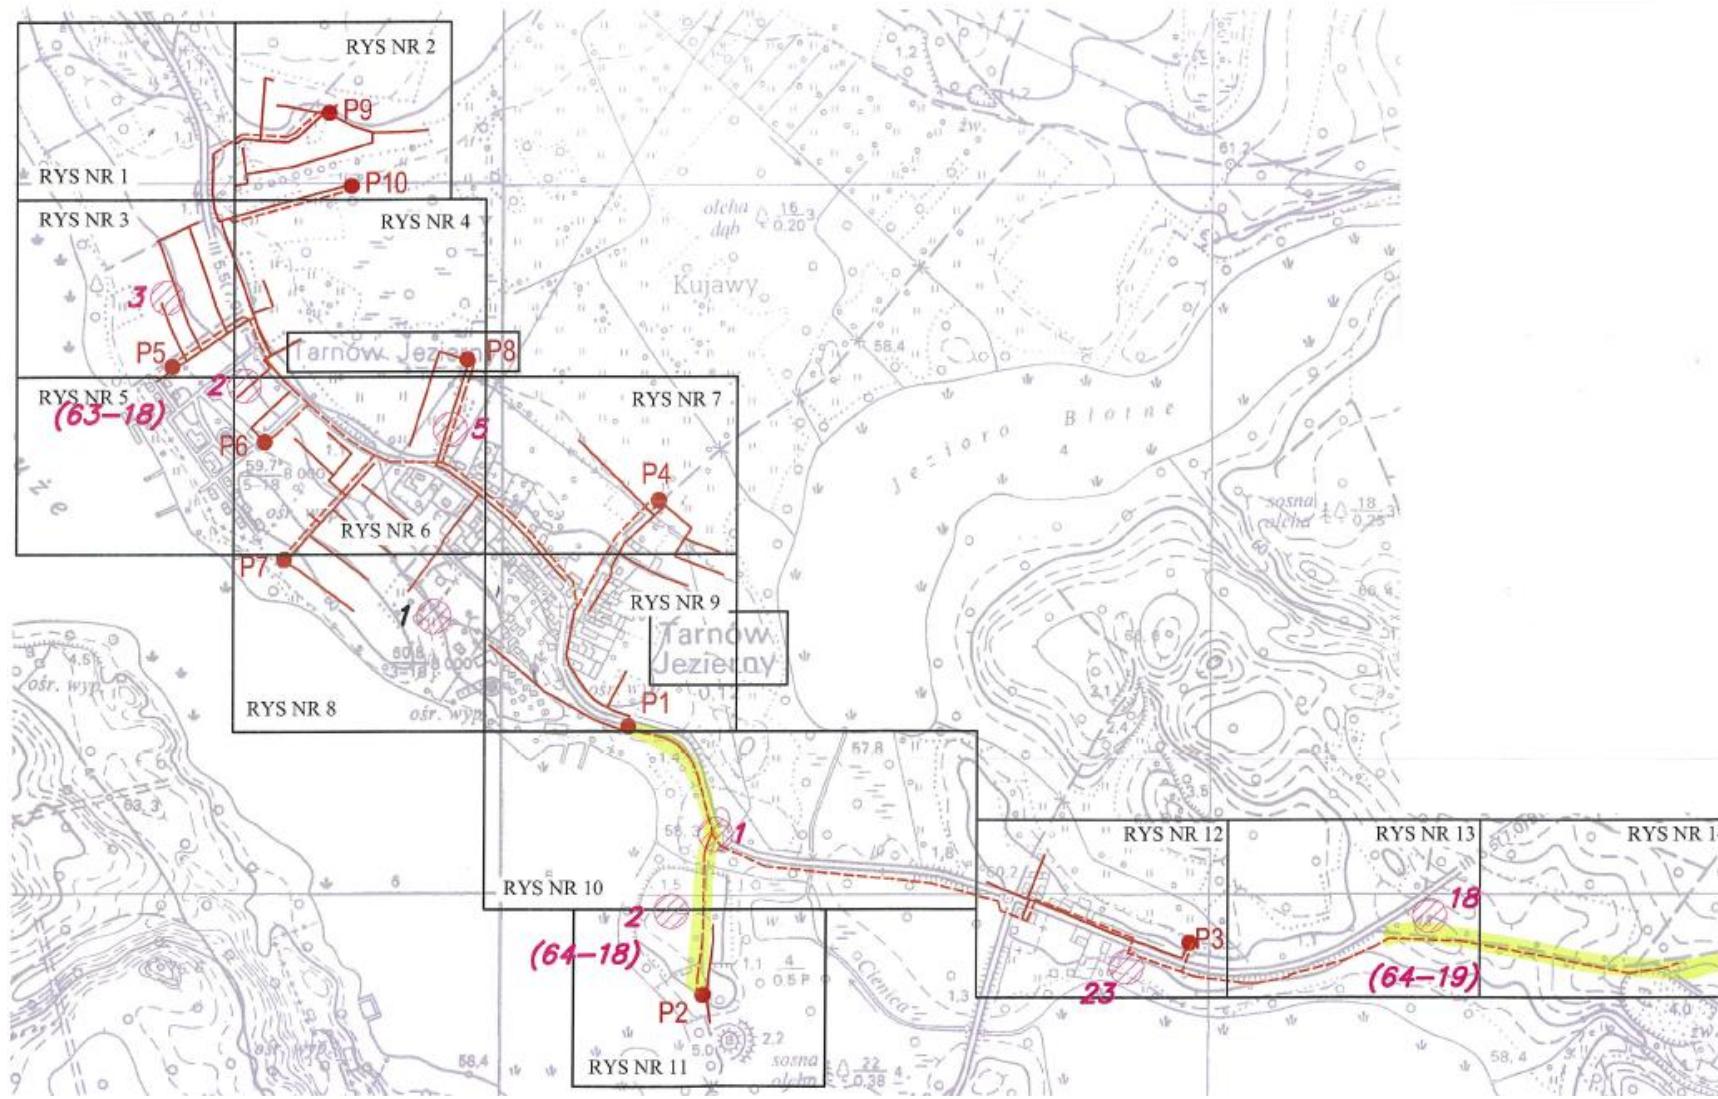


Miejscowość Tarnów Jezierny

ES 13: Sieć wodociągowa dla wsi Tarnów Jezierny

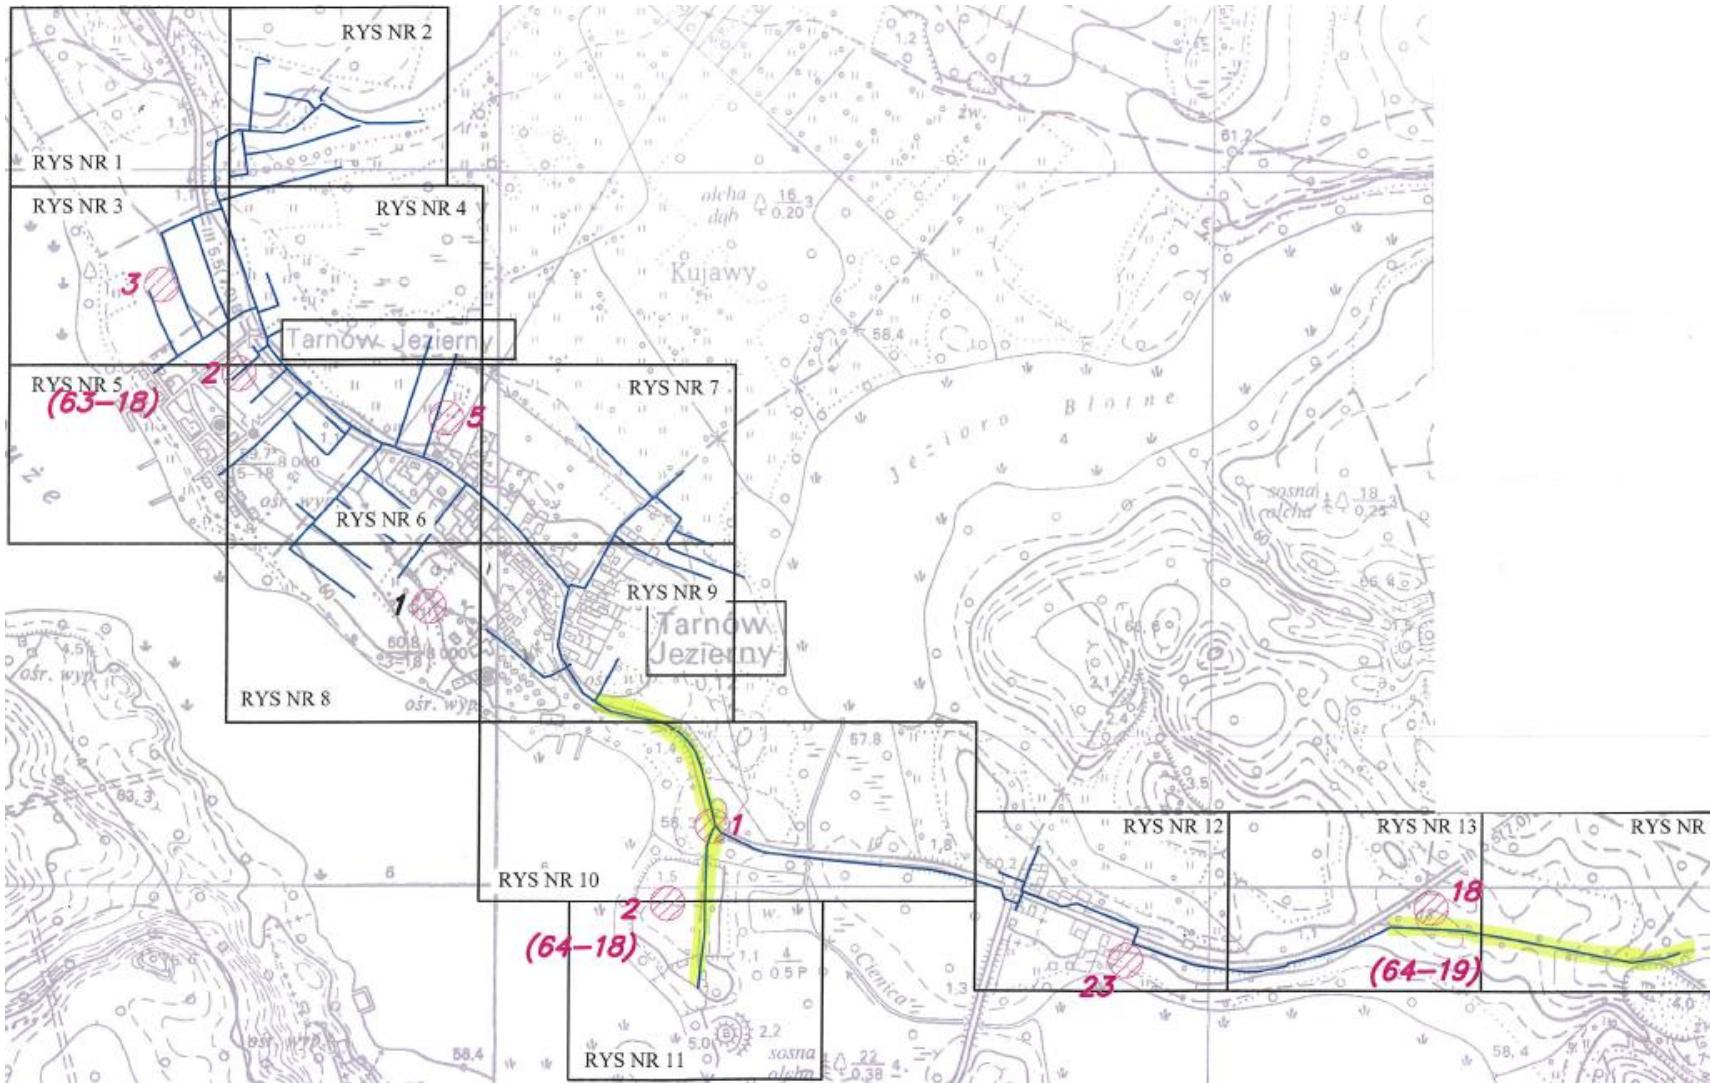

Miejscowość Radzyń


ES 6: Kanalizacja sanitarna dla wsi Radzyń oraz rurociąg tłoczny Radzyń - Lipinki

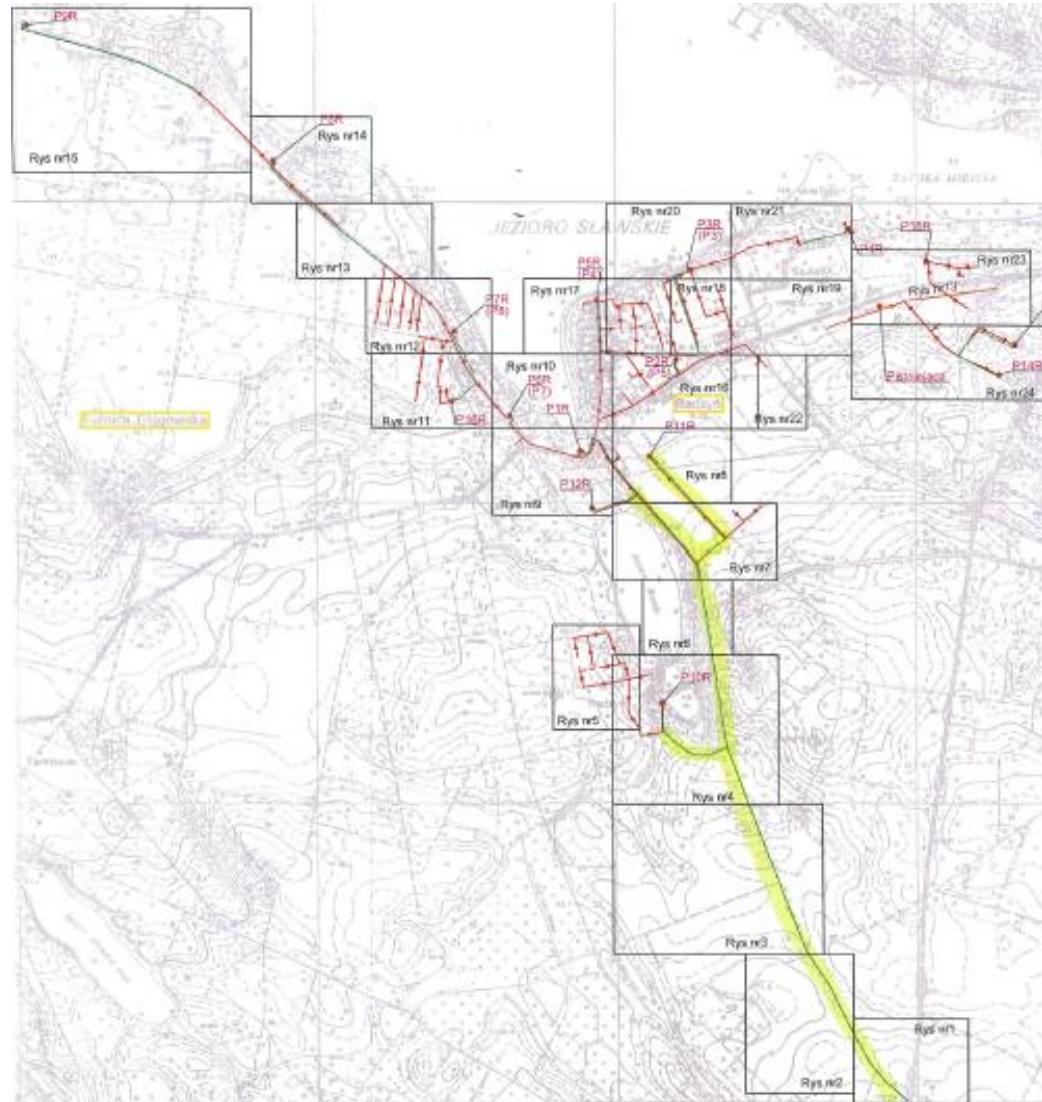

8,51%

Miejscowość Radzyń

ES 14: Sieć wodociągowa dla wsi Radzyń z rurociągiem tranzytowym Radzyń – Kuźnica Głogowska

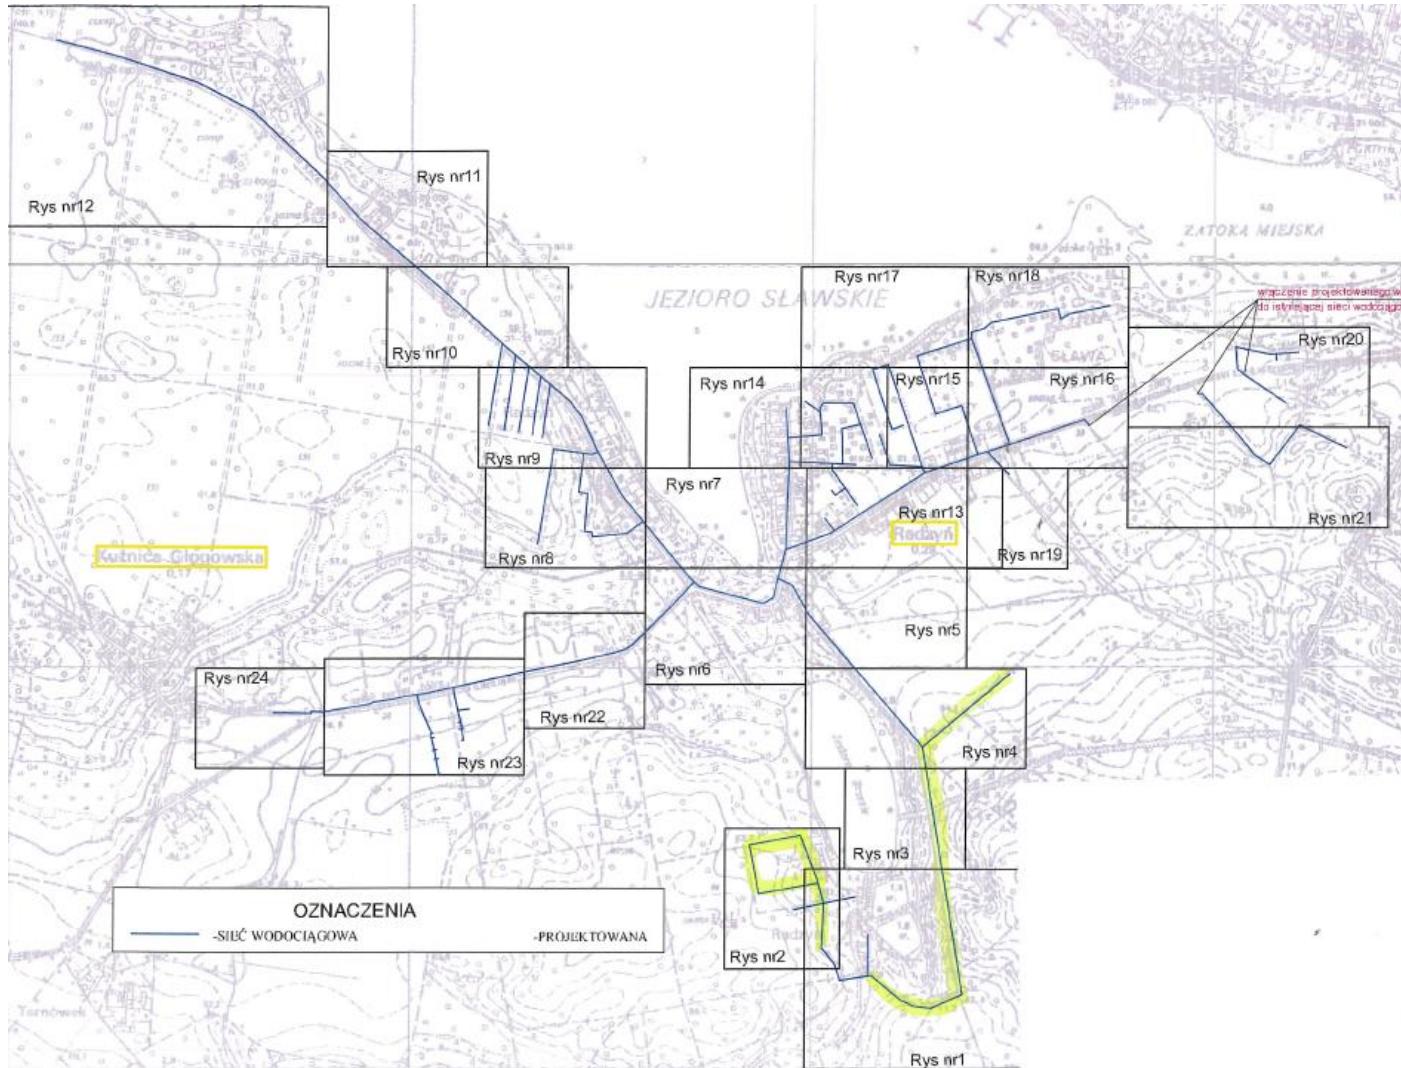


11,54%



Miejscowość Lipinki

ES7: Kanalizacja sanitarna dla wsi Lipinki oraz rurociąg tłoczny Lipinki - Krążkowo

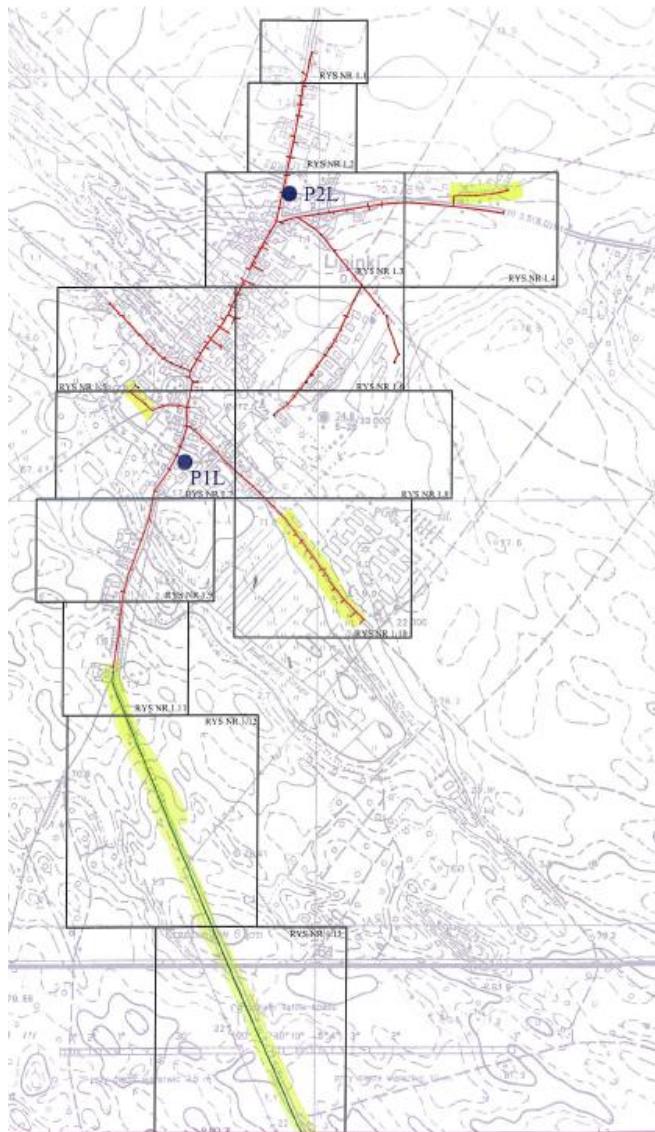


24,55%

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
NA TERENIE AGLOMERACJI ŚLAWA ETAP I
ZLEWNIA OCZYSZCZALNI KRAŻKOWO

Miejscowość Krążkowo

ES8: Kanalizacja sanitarna dla wsi Krążkowo

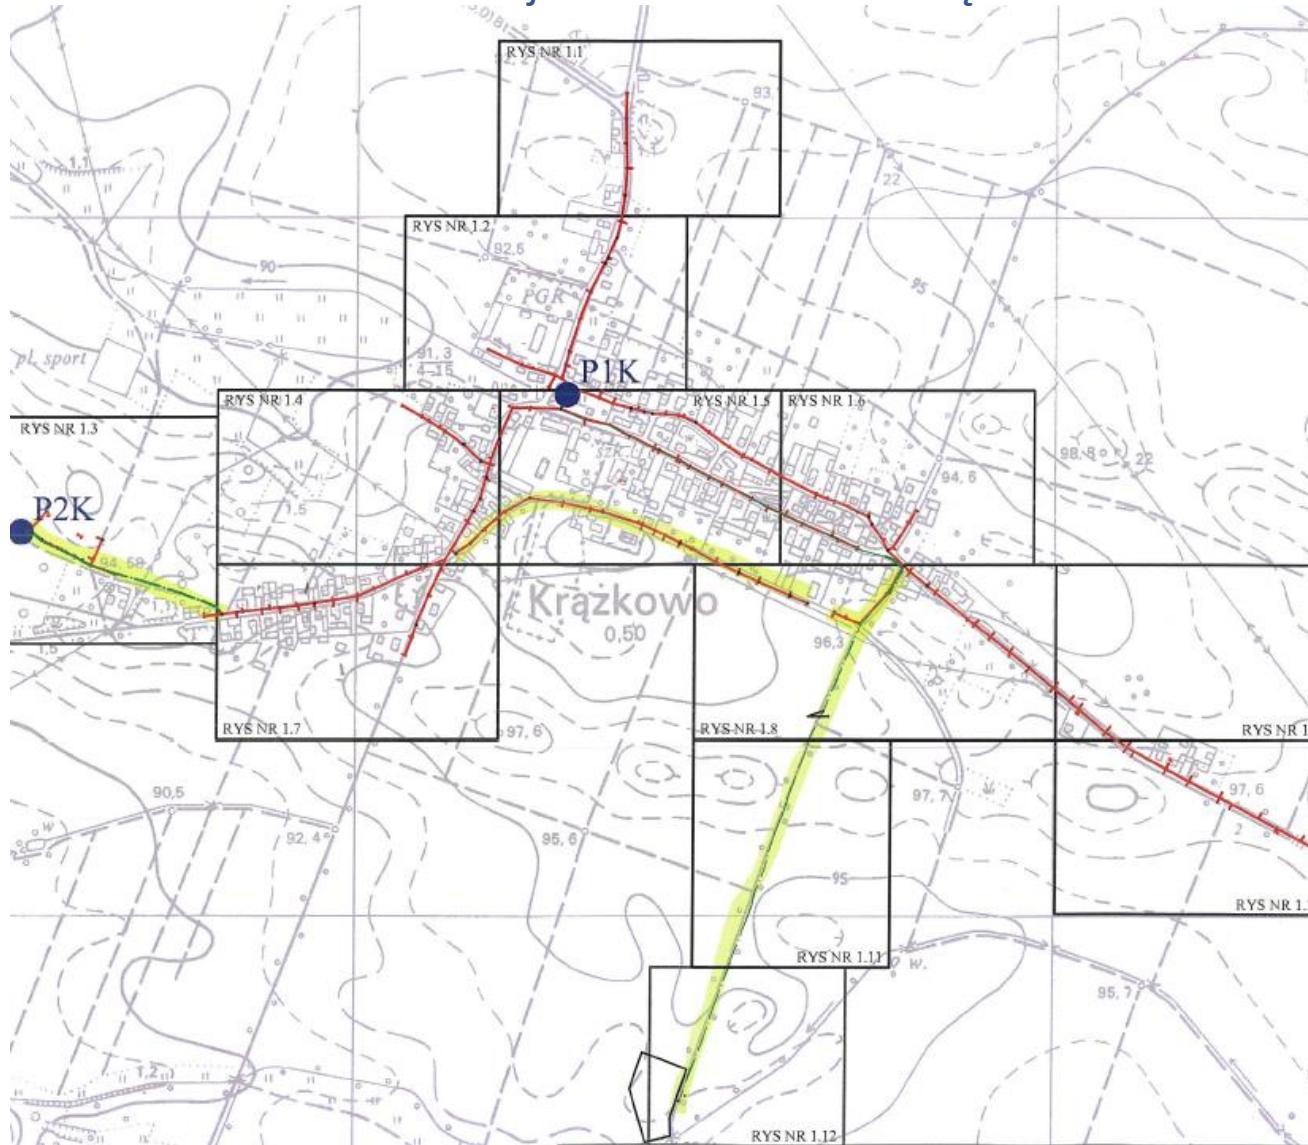


18,84%

Zadaniem projektowanej kanalizacji grawitacyjno – tłocznej jest odprowadzanie ścieków ze wszystkich miejscowości i doprowadzenie ich do Oczyszczalni Ścieków w Krążkowie. Biorąc pod uwagę jak rozległa jest sieć w ramach inwestycji zostanie wykonanych 40 przepompowni, 1 tłocznie, studnie rozprężne, pomiarowe oraz kontrolne potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania oraz eksploatacji sieci kanalizacyjnej.

Oczyszczalnia Ścieków, która średnio dobowo będzie przyjmowała 800m³/d.

Sieć wodociągowa zaopatrywać będzie w wodę do celów bytowo – gospodarczych oraz przeciwpożarowych. Woda ta będzie pozyskiwana i uzdatniana w nowej SUW w Kuźnicy Głogowskiej, który pobierać będzie wodę z dwóch studni głębinowych o zatwierzonej wydajności 44m³/h.

Oczyszczalnia Ścieków w Krążkowie

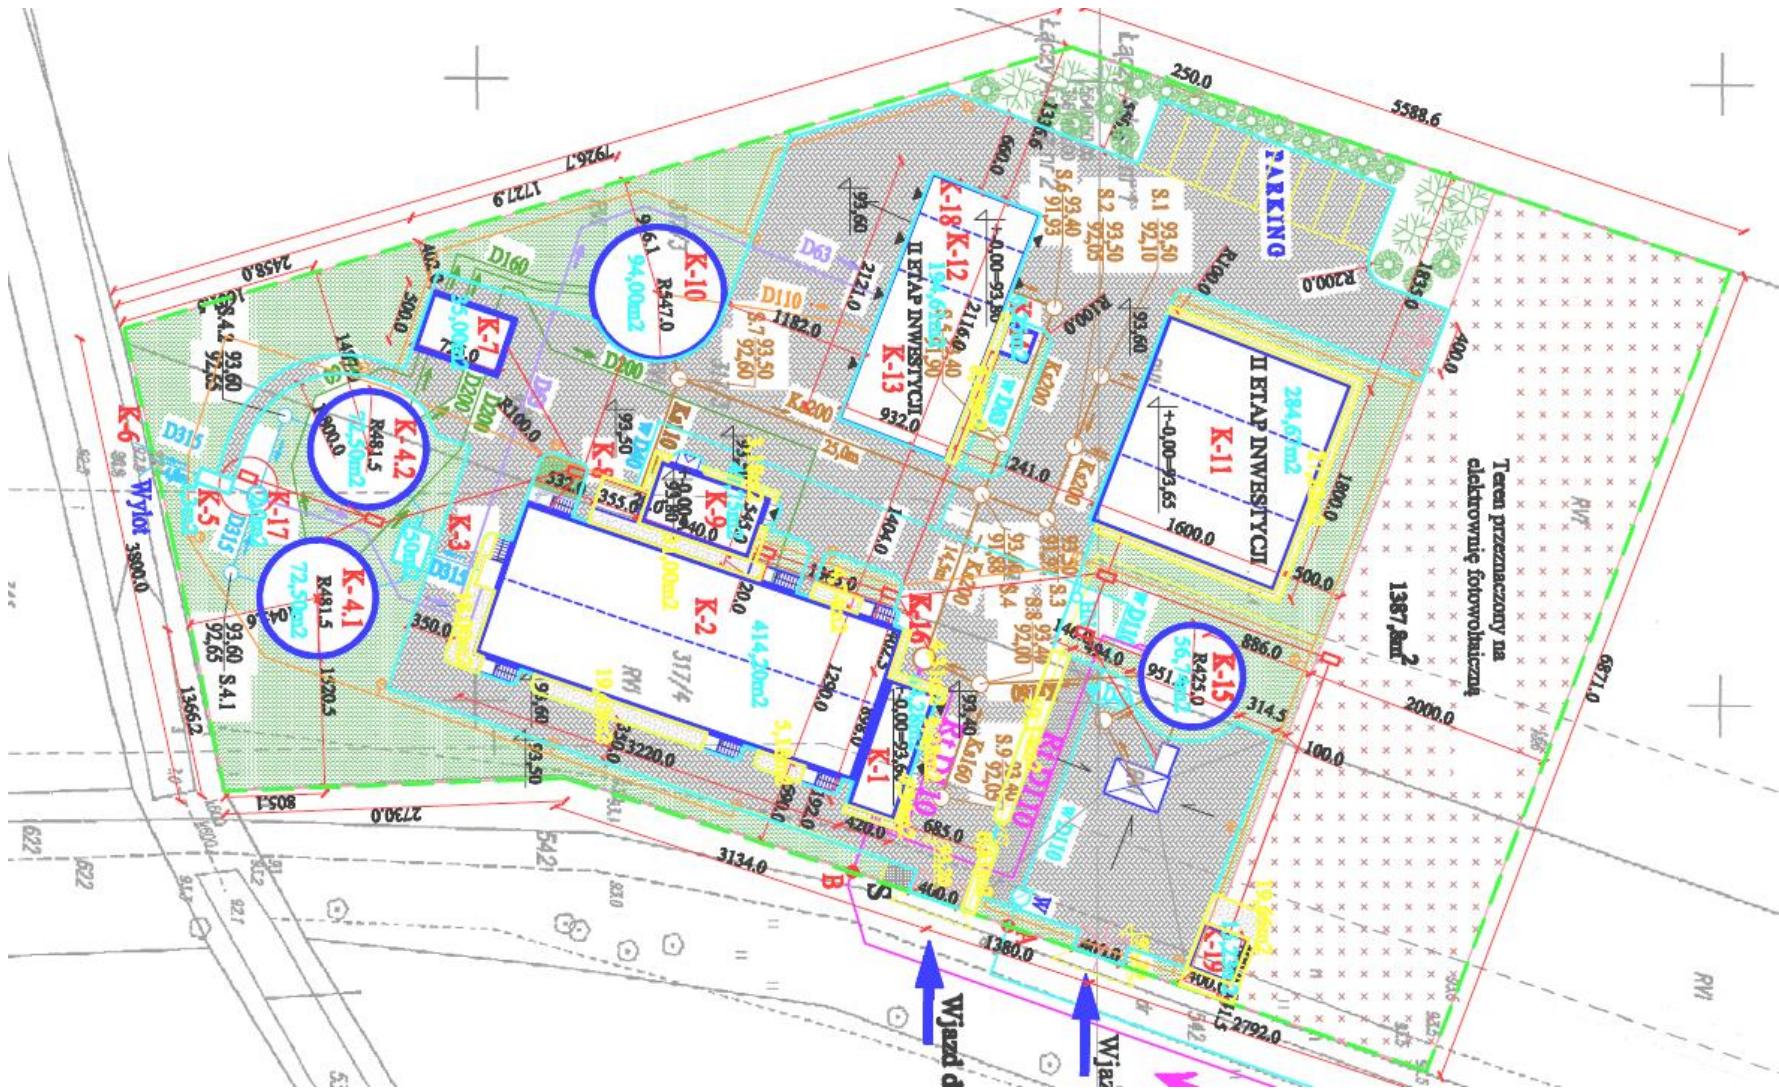

Oczyszczalnia Ścieków w Krążkowie



Zbiornik OŚ Krążkowo, Źródło: Archiwum Generalnego Wykonawcy



Betonowanie płyty dennej, OŚ Krążkowo, Źródło: Archiwum Generalnego Wykonawcy



Zbiornik wyrównawczy, SUW Kuźnica Głogowska; Źródło: Archiwum Generalnego Wykonawcy



SUW Kuźnica Głogowska; Źródło: Archiwum Generalnego Wykonawcy



Plac budowy, Kuźnica Głogowska; Źródło: Archiwum Generalnego Wykonawcy



Hydrant przeciwpożarowy, Kuźnica Głogowska; Źródło: Archiwum Generalnego Wykonawcy



Węzeł wodociągowy, Tarnówek, Źródło: Archiwum Generalnego Wykonawcy



Odtworzona droga, Krążkowo; Źródło: Archiwum Generalnego Wykonawcy



Wiata pod agregat, SUW Kuźnica Głogowska; Źródło: Archiwum Generalnego Wykonawcy



Kanalizacja grawitacyjna, Krążkowo; Źródło: Archiwum Generalnego Wykonawcy



Prace przewiertowe, Lipinki-Krążkowo, Źródło: Archiwum Generalnego Wykonawcy

Zaangażowanie sił roboczych



70 pracowników fizycznych



15 pracowników kadry kierowniczej oraz inżynierskiej



15 sztuk różnego sprzętu budowlanego (koparki, maszyny przewiertowe, dźwig, betoniarki wraz z pompami)



15 sztuk aut ciężarowych oraz dostawczych



Ok. 40 sztuk drobnego sprzętu budowlanego (zagęszczarki, zgrzewarki do rur PEHD, agregaty prądotwórcze, sprężarki powietrza)

W związku z trwającymi pracami budowlanymi, którymi objęta jest Inwestycja, prosimy wszystkich mieszkańców oraz gości gminy Sława o cierpliwość i wyrozumiałość w związku z wszelkimi utrudnieniami spowodowanymi robotami.



Uwagi i skargi prosimy zgłaszać następującym osobom:

Kierownik Budowy: Dariusz Czajkowski tel. 603-908-936

Dyrektor Kontraktu: Zbigniew Chryplewicz tel. 661-418-460

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
NA TERENIE AGLOMERACJI SŁAWA ETAP I
ZLEWNIA OCZYSZCZALNI KRAŻKOWO



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności

